
BRAVOS HABITAT
CONCEPTION · CONSTRUCTION · GUADELOUPE

ESTIMATION BUDGÉTAIRE
Réf. EST-2026-011
Date : 10/11/2026
Validité : 1 mois

Maison modulaire ≈ 60 m²
Qu'est-ce qu'on a pour 60 000 € ?

4 modules de 2,49 × 6 m assemblés, menuiseries aluminium, toiture, transport et pose — avec en option la dalle béton, pour voir si tout rentre dans le budget. Prix estimés aux conditions de la Guadeloupe (TVA DOM 8,5 %).

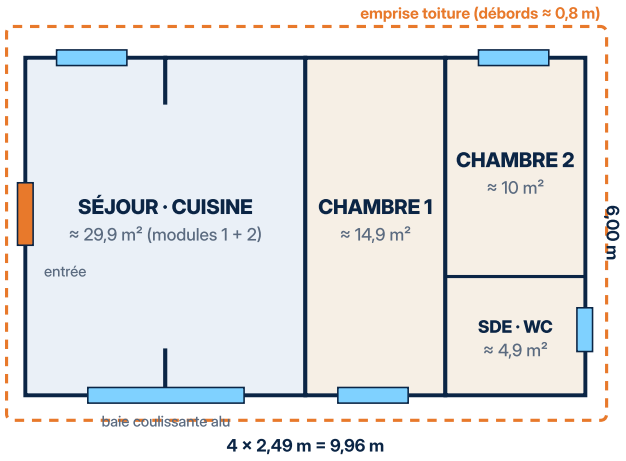

Plan de principe indicatif — distribution adaptable (2 ou 3 chambres, cuisine ouverte, terrasse...).

SURFACE DES MODULES
59,8 m²

PACK SANS DALLE (TTC)
59 784 €

PACK + DALLE BÉTON (TTC)
69 570 €

BUDGET CLIENT
60 000 €

DÉTAIL DE L'ESTIMATION

DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
1 Modules préfabriqués 2,49 × 6 m Ossature acier galvanisé, panneaux sandwich isolés (murs et plafond), plancher, cloisons, pré-câblage électrique, attentes plomberie. 14,94 m² par module.	4 u	6 900 €	**27 600 €**
2 Fret maritime jusqu'au port de Jarry Transport maritime de chaque module jusqu'à Pointe-à-Pitre (Jarry), assurance transport comprise.	4 u	2 000 €	**8 000 €**
3 Dédouanement, frais portuaires et octroi de mer Transitaire, manutention au port, octroi de mer et octroi de mer régional (estimation).	1 forf.	3 500 €	**3 500 €**
4 Livraison sur terrain, grutage et assemblage Camion plateau depuis Jarry, camion-grue, mise en place sur fondations, liaison et étanchéité entre les modules.	1 forf.	3 500 €	**3 500 €**
5 Menuiseries aluminium (fourniture et pose) 1 porte d'entrée alu (1 300 €), 1 baie coulissante 2,40 m (2 000 €), 4 fenêtres alu 1,00 × 1,25 m (4 × 650 €), 2 jalousies alu pour la salle d'eau et le WC (2 × 500 €).	1 forf.	6 900 €	**6 900 €**
6 Toiture Charpente légère, tôle bac acier laquée, faîtage, rives, gouttières, fixations para-cycloniques. Débords d'environ 0,8 m pour l'ombre et la ventilation.	80 m²	70 €	**5 600 €**
Sous-total pack (hors dalle)			**55 100 €**
7 OPTION — Dalle béton armé 10,5 × 6,5 m Fondations (semelles et longrines), hérisson, film polyane, dalle de 12 cm ferraillée, réservations pour l'eau, l'électricité et l'évacuation. Béton livré en toupie.	68 m²	115 €	**7 820 €**
8 OPTION — Implantation et préparation du terrain Implantation, décapage de la terre végétale, mise à niveau sur un terrain plat.	1 forf.	1 200 €	**1 200 €**

RÉCAPITULATIF

Pack 4 modules + menuiseries alu + toiture + transport — HT	55 100 €
TVA 8,5 % (Guadeloupe)	4 684 €
PACK SANS DALLE — TTC	**59 784 €**
Dalle béton + préparation — TTC	9 787 €
PACK + DALLE BÉTON — TTC	**69 570 €**

Verdict : avec 60 000 €, on a le **pack complet hors dalle** (59 784 € TTC). En ajoutant la dalle béton, on arrive à **69 570 € TTC, soit environ 9 600 € de plus que le budget**. Les pistes d'économie ci-dessous réduisent l'écart d'environ 4 000 à 6 000 €, sans tout absorber : avec la dalle, il faut plutôt prévoir **65 000 à 70 000 € TTC**.

COMPRIS DANS LE PACK

- ✓ 4 modules 2,49 × 6 m isolés, assemblés et étanchés entre eux
- ✓ Pré-câblage électrique et attentes plomberie dans les modules
- ✓ Menuiseries aluminium : porte, baie, fenêtres, jalousies
- ✓ Toiture tôle sur charpente, avec débords contre le soleil et la pluie
- ✓ Fret maritime, dédouanement, octroi de mer, livraison par camion-grue
- ✓ Suivi du chantier par votre conducteur de travaux

NON COMPRIS (À PRÉVOIR)

- ✗ Plans, permis de construire, étude de sol (G2), bureau d'études
- ✗ Terrassement important, accès difficile ou terrain en pente
- ✗ Assainissement : fosse toutes eaux + épandage (≈ 6 000 à 9 000 €)
- ✗ Raccordements EDF, eau, télécom (selon distance)
- ✗ Appareils sanitaires, cuisine équipée, carrelage, peinture
- ✗ Terrasse, clôture, portail, aménagements extérieurs

COMMENT TENIR LES 60 000 €

- → **Fondations sur plots et longrines** au lieu d'une dalle pleine : environ 3 500 € d'économie (selon le sol).
- → **Des fenêtres simples à la place de certaines jalousies**, et une seule baie coulissante.
- → **Toiture simple à 2 pans**, avec des débords réduits côté vent.
- → **Vous préparez vous-même** le terrain (débroussaillage, accès camion) avant la livraison.

HYPOTHÈSES DE L'ESTIMATION

Prix estimés en novembre 2026 pour un terrain plat, accessible à un camion-grue, situé à moins de 40 km du port de Jarry. Modules importés (structure acier galvanisé, panneaux sandwich isolés) : le fret et l'octroi de mer peuvent varier selon l'origine, le code douanier et la période. La TVA est appliquée au taux de 8,5 % en vigueur en Guadeloupe. Les modules, la toiture et les fixations doivent respecter les règles para-sismiques (zone 5) et para-cycloniques : à confirmer par le bureau d'études. **Ce document est une estimation indicative et non un devis contractuel.** Le prix définitif sera établi après la visite du terrain et le choix des équipements.

Jérôme Belfort — Conducteur de travaux
bravoshabitat@gmail.com · Guadeloupe

0690 33 66 26
WhatsApp
